


Заключение №2.0106.2

заказчик ООО «РИ-Пионер»	исполнитель ООО «Инспекция»
дата 07.04.2021 г.	место проведения Тагринское м-р, к.№25а
Наименование inspected instrument ЛБТ 147х13П; к-кт №3-2018; 4-2019	количество 006 шт.
методы контроля ВИК, УЗД, УЗТ.	НТД РД 03-606-03; РД 39-013-90; РД 41-01-25-89; МУ 1198-00.001, тех. задание.
используемые приборы и инструменты	
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г..	

Схема контроля:

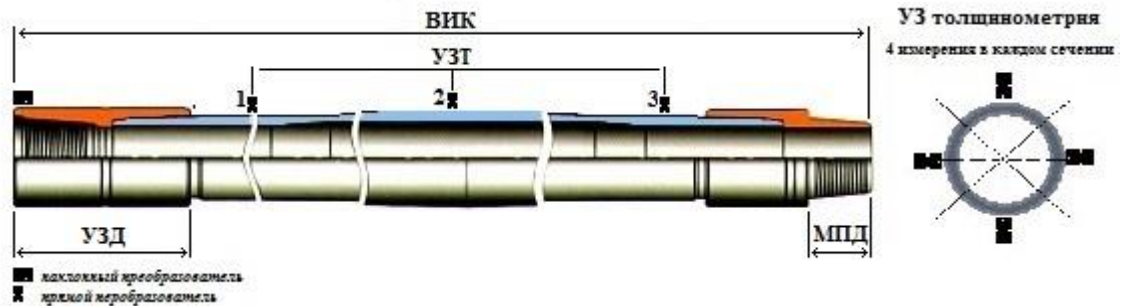

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Инструмент к работе не годен , требуется ремонт, кол - во						006 шт.
ремонт ЗП муфта			ремонт ЗП ниппель			ремонт тело
наружный ϕ	резьбовое соединение	L	наружный ϕ	резьбовое соединение	L	искривление
-	6	-	-	6	-	-

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

Результаты контроля

п/п	№ к-та/инс-та	Зона контроля № 1				Зона контроля № 2				Зона контроля № 3			
		ЗП муфта			Св. шов	Результат толщинометрии			Сост. тела	ЗП ниппель			Св. шов
		Наруж Ø(мм)	L (мм)	Резьба		Сеч. 1 мин. знач.	Сеч. 2 мин. знач.	Сеч. 3 мин. знач.		Наруж Ø(мм)	L (мм)	Резьба	
001	3-2018/38354	174,4	335	<i>ремонт</i>	-	12,7	17,5	12,9	норма	174,0	205	<i>ремонт</i>	-
002	3-2018/38111	174,3	323	<i>ремонт</i>	-	12,8	18,2	12,8	норма	174,0	200	<i>ремонт</i>	-
003	3-2018/38112	174,8	320	<i>ремонт</i>	-	13,0	19,0	12,9	норма	174,3	200	<i>ремонт</i>	-
004	3-2018/38113	174,5	322	<i>ремонт</i>	-	12,6	17,0	12,9	норма	174,2	200	<i>ремонт</i>	-
005	4-2018	175,6	335	<i>ремонт</i>	-	12,9	18,6	13,0	норма	175,4	243	<i>ремонт</i>	-
006	4-2018	177,6	365	<i>ремонт</i>	-	13,2	21,0	13,1	норма	176,4	257	<i>ремонт</i>	-

* на ЗП БТ нанесён синий цвет (ниппель).

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

The Leader in the Field of High-Quality Nondestructive Control
