

Заключение №2.0250.3

заказчик	исполнитель
ООО «РИ-Пионер»	ООО «Инспекция»


дата	место проведения
11.02.2021г.	В-Шапшинское м-р, к.№23

Наименование inspected instrument	количество
ВБТ 140; 3-152Л/3-147; соед. 3-122; №7281/1; 7281/2	02 шт.

методы контроля	НТД
ВИК, УЗД, МПД.	РД 03-606-03; РД 39-013-90; РД 41-01-25-89; РД 13-05-2006; МУ 1300 01.000.

используемые приборы и инструменты
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г..

Схема контроля:

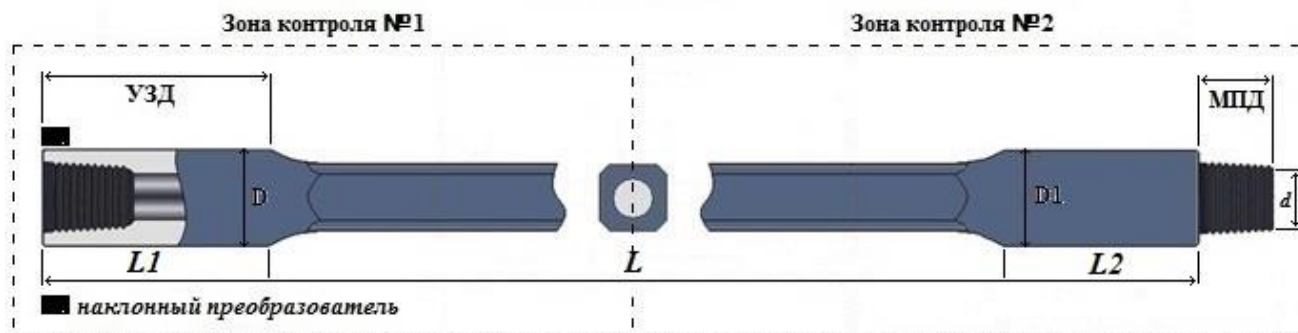

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На момент проведения дефектоскопии дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен.
--

Дата проведения следующей плановой проверки	100821	или через каждые 1500 часов вращения ротором
---	---------------	--

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

Результаты контроля

№п/п	№ ин-та.	Зона контроля № 1			Зона контроля № 2			соед.резьбовое	d	тело
		D	L1(мм)	Резьба	D1	L2(мм)	Резьба	соед.		
001	7281/1	197,7	443	норма	-	-	норма	норма	74	норма
002	7281/2	-	-	норма	175,9	400	норма	норма		норма

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

The Leader in the Field of High-Quality Nondestructive Control
